

## Lista aktivnosti s izračunom trajanja


Br.	Opis aktivnosti	Količina	Jed. mj.	Sastav radne grupe	$U_{pRG}$	$T_A = \frac{Q}{U_{pRG} \times N_{RG} \times h_d}$ $T_A = \frac{Q \times N_{sRG}}{N_{RG} \times h_d}$	$T_A$
1.							
2.	Iz strukture mrežnog plana	Iz dokaznice mjera		Iz organizacije radnih procesa		Izračun s formulom	
3.							

Trajanje aktivnosti  
zaokruženo na cijeli broj dana


## Primjer liste aktivnosti

Br	Opis aktivnosti	Trajanje [dani]	Prethod.aktivn.	Veza	Odgoda [dani]
1	A	10			
2	B	45	1	finish-start	+10
3	C	15	1	finish-start	0
4	D	5	1	finish-start	0
5	E	40	3	finish-start	0
6	F	90	2	finish-start	+10
7	G	15	4	start-start	+15
8	H	30	7	finish-start	0
9	I	40	5	finish-start	0
10	J	5	6	finish-start	0
11	K	5	8, 9, 10	finish-start	0

# Struktura čvornog mrežnog plana - primjer

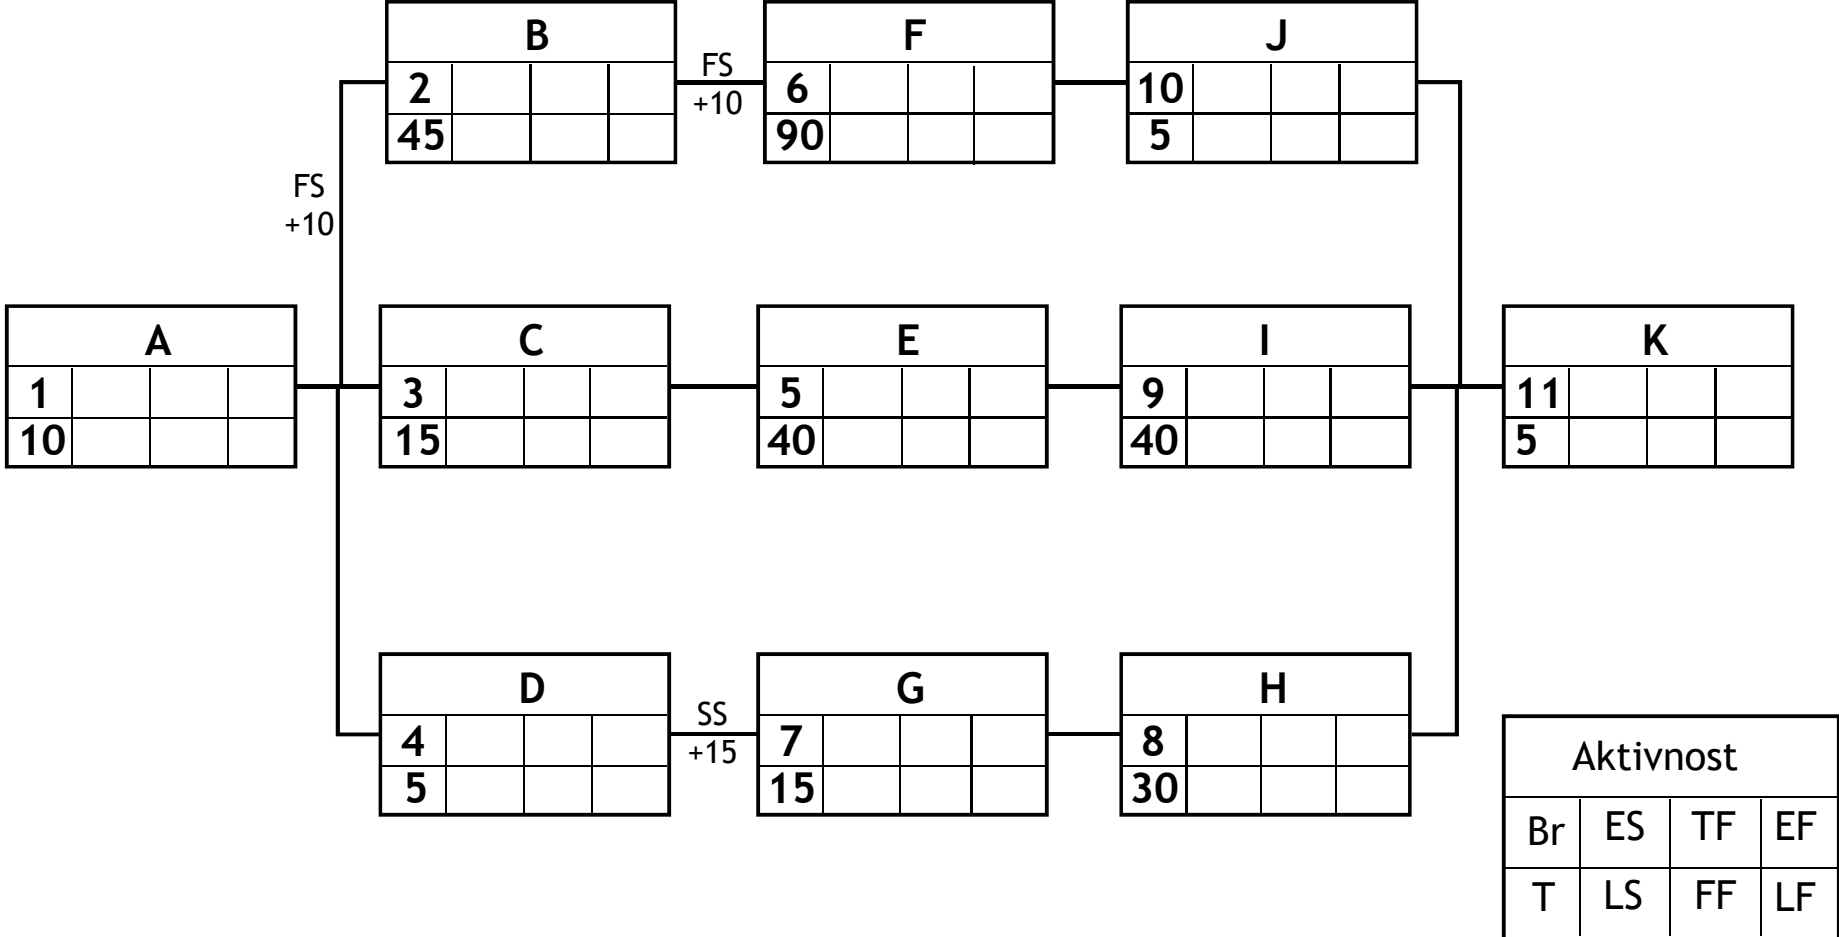


## Vremenski proračun čvornog mrežnog plana - *primjer*

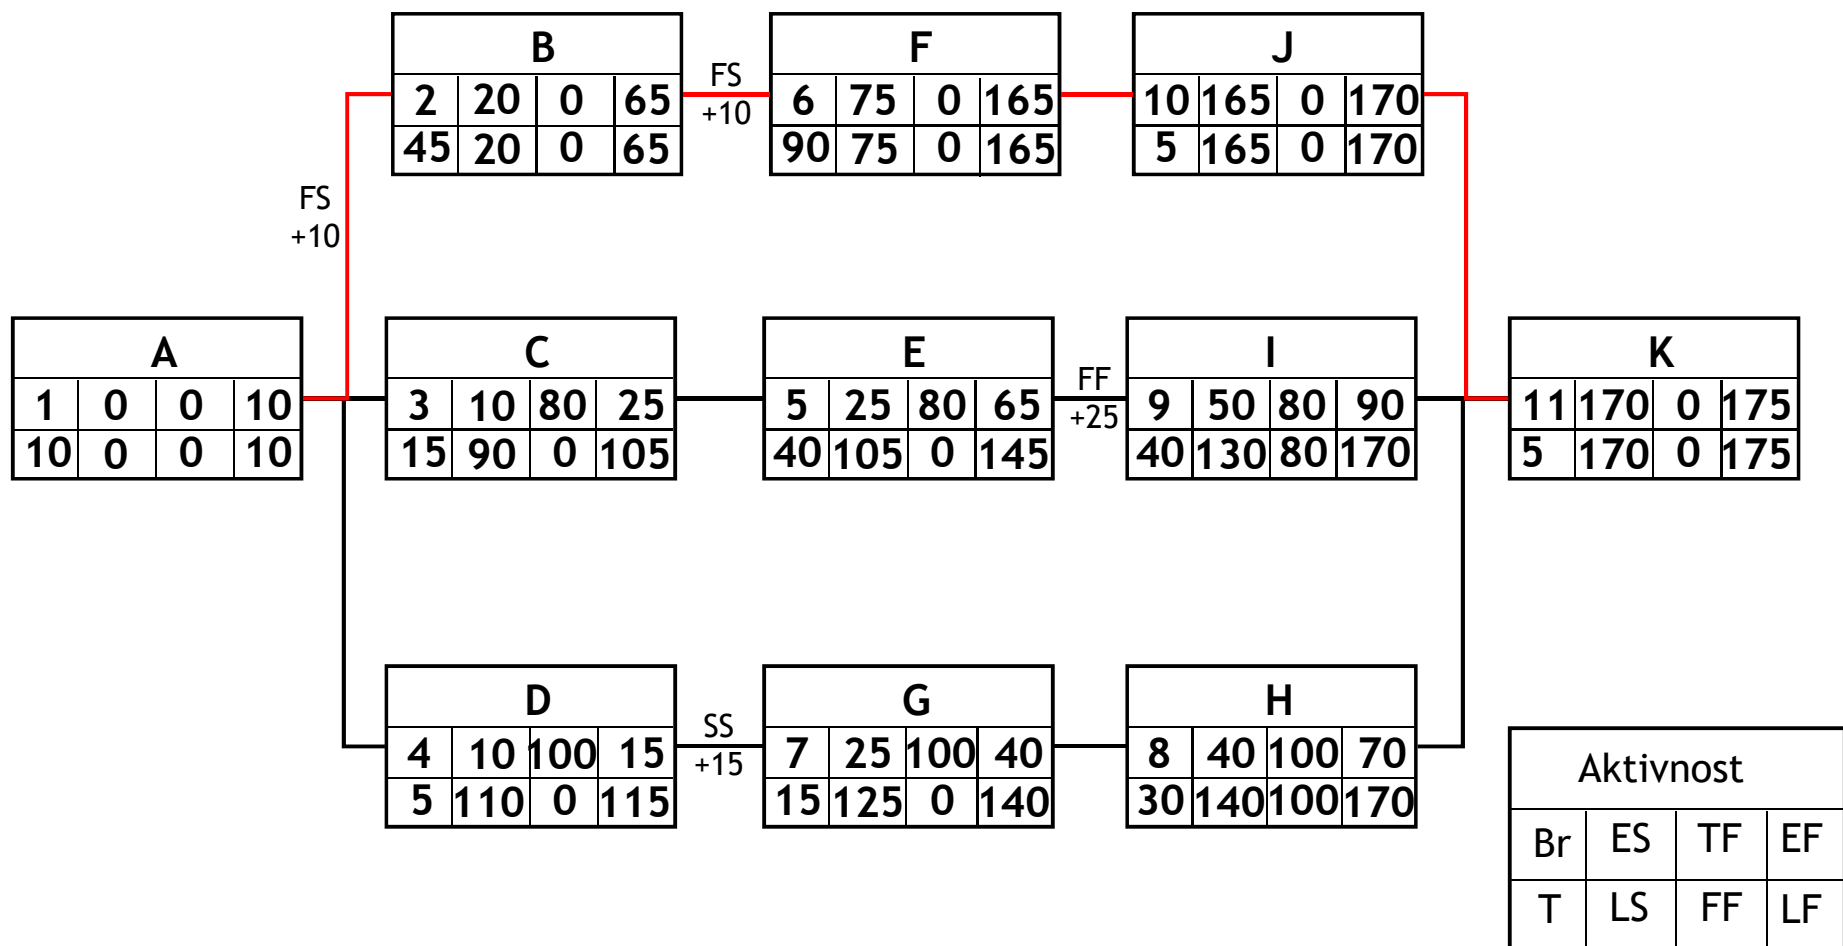

# Izvedeni GANTOGRAM (za najranije položaje aktivnosti)

– prema prethodnom mrežnom planu

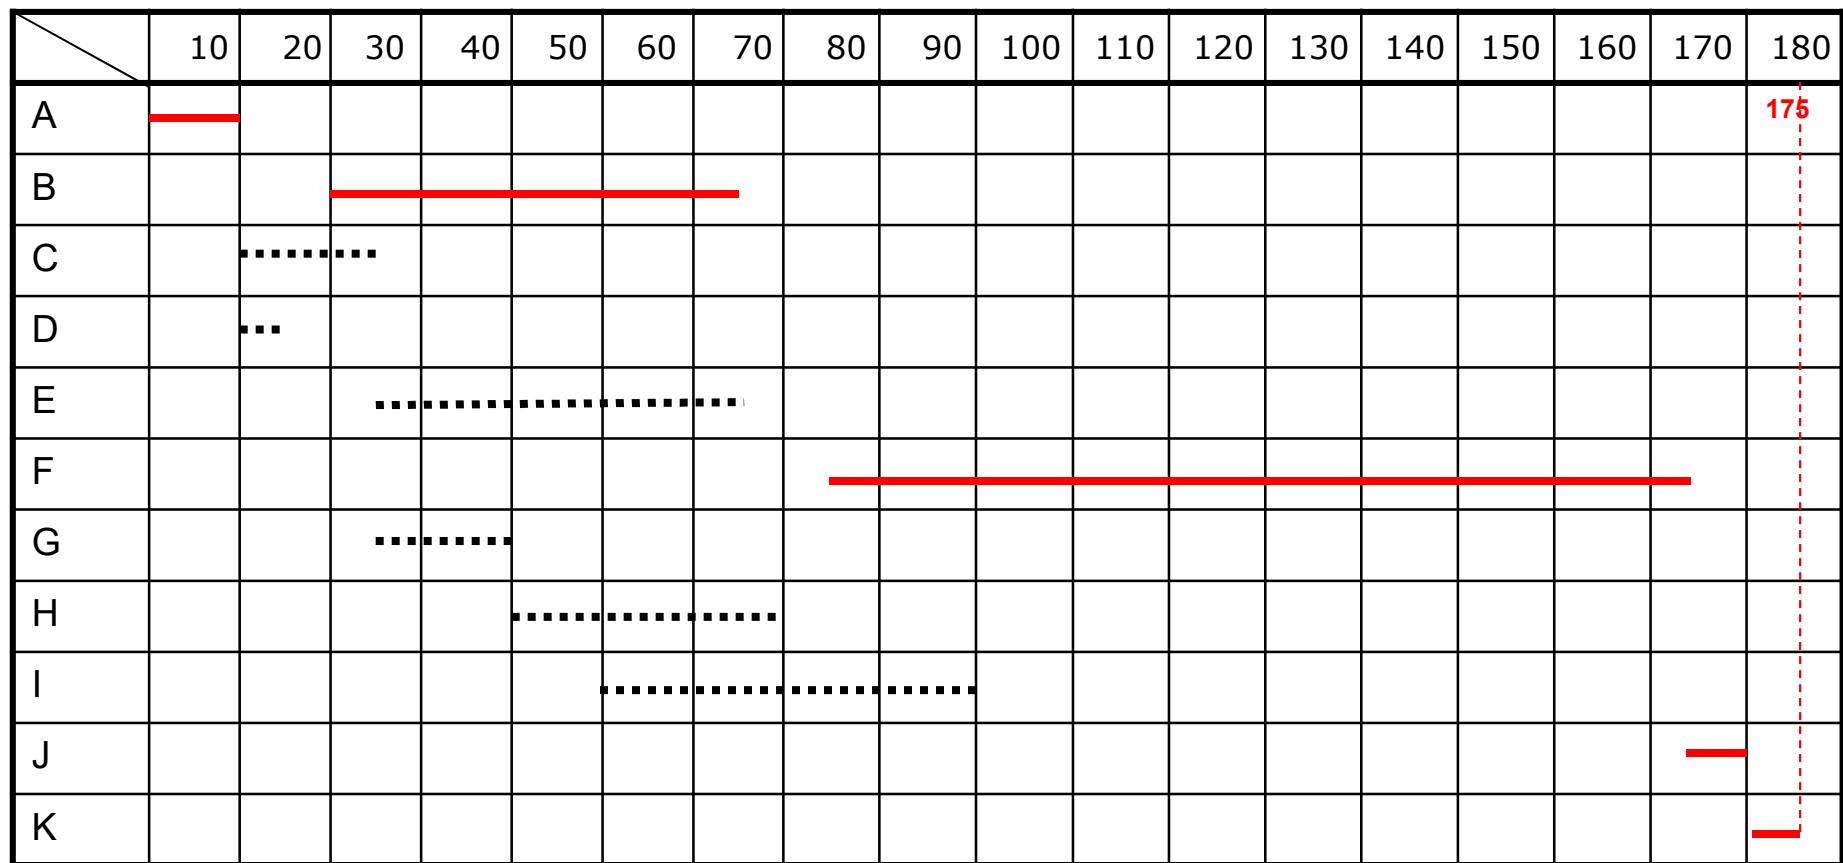

- Kritične aktivnosti
- Nekritične aktivnosti

# Primjer proračuna mrežnog plana unaprijed i unatrag

